


The background is a colorful illustration divided into four quadrants. The top-left quadrant shows green hills and a blue sky with white clouds. The top-right quadrant shows a blue sky with white clouds and a green landscape. The bottom-left quadrant shows a blue river with white fish and a green landscape. The bottom-right quadrant shows a blue river with white fish and a green landscape. The text is centered over the top two quadrants.


環境部 「前瞻水環境建設計畫資訊整合教育訓練」 114年



簡報大綱

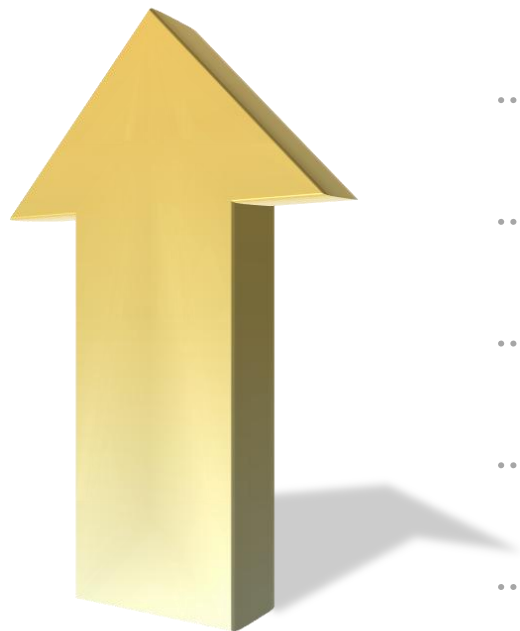

- 壹、前瞻系統現況
- 貳、前瞻功能說明
- 參、前瞻填報通知
- 肆、前瞻資訊整合及公開



前瞻基礎設計畫綜合管理平臺

系統面 前瞻資料填報

- 根據不同縣市、計畫類型、管理單位、執行單位及其他分類需求，填報相應資料文件，並產製資料整合總表、進度、經費明細分表等統計報表。
- 每月考評資料填報計分成果

[illegible]

管理面 進程瀏覽管考

- 配合整體計畫進度、經費等資料填報，針對作業人員進行作業提醒、改善追蹤，以掌握計畫整體進程。
- 新增各縣市114年補助案件



呈現面 資訊公開

- 有效掌握各計畫執行、經費占比狀況及總體達超前與落後進度等資訊。
- 整合水庫集水區保育治理計畫資料





壹、前瞻管理平臺-系統現況

前瞻基礎建設計畫綜合管理平臺(管理後臺)

基本資料

- 計畫狀態
- 中央/地方經費
- 工程點位基本資訊
- 污水設施處理

執行狀況

- 計畫流程
- 工作進度
- S-curve圖

經費支用

- 計畫經費總覽
- 撥付細項
- 支用細項
- 計畫期款

進度文件

- 考核文件
- 工程成果
- 媒體揭露

前瞻基礎建設專區【前臺民眾網】



前瞻管理平臺登入資訊

水質保護網：<https://water.moenv.gov.tw/>

前瞻平臺網址：<https://water.moenv.gov.tw/PMIS/login.aspx>



內部業務網站



重點政策與法規>前瞻基礎建設

前瞻管理平臺





貳、前瞻管理平臺-首頁

- 依帳號權限查詢各計畫類型(經資門) 資料，包含預算來源、年度、縣市、類型、名稱等。
- 基本資料包含計畫名稱、進度、經費撥付、經費支用等。

計畫預算來源 ☐水與環境 ☐水與發展

年度

縣市

執行單位

計畫批次

計畫類型

計畫狀態

計畫名稱

查詢

清除查詢

新增

- 計畫查詢條件
(預設查詢114年度)

計畫資料上傳檢核報表

考評資料得分報表

計畫執行經費統計表

第 1 / 30 頁 | 共 295 筆 | 跳至 頁 | 上一頁 下一頁 每頁顯示 筆

編號	年度	縣市	計畫名稱	計畫類型	工作狀態	工作進度	核定補助經費(仟元)	總撥付經費(仟元)	總支用經費(仟元)	支用比率(%)	
1	114	嘉義市	維新支線嘉義大學段水環境改善整體計畫-維新支線嘉義大學段水環境改善工程(第一期)	資本門	未填						檢視 刪除
2	114	苗栗縣	苗栗縣金色中港河口水環境整體改善計畫-竹南鎮射流溝水岸環境改善計畫	資本門	未填						• 點選檢視單一計畫資料
3	113	臺中市	113年臺中市全國水環境水質改善業務支援計畫	經常門	未填						檢視 刪除
4	113	基隆市	113年度基隆市全國水環境水質改善業務支援計畫	經常門	未填		624,000				檢視 刪除



貳、前瞻管理平臺-計畫基本資料

- 依各計畫類型(經資門)顯示基本基料欄位、資本門案件需填寫工程資料。

基本資料

計畫執行

經費支出

考核文件上傳

工程計畫成果

基本資料

計畫名稱	新北市水質改善工程計畫-鴨母港溝補注水處理工程		
補助機關	新北市政府水利局	縣市	新北市
年度	109	核定日期	
計畫狀態	已結案	計畫類型	資本門_工程
計畫批次	4	自行辦理	☐ 是 ☒ 否
得標廠商	勁竹營造有限公司		

計畫基本資料

計畫核定經費

中央補助經費(仟元)	34956	地方配合款(仟元)	14981
計畫總經費(仟元)	49937		

計畫核定經費

計畫決標經費

中央補助經費(仟元)	34807	地方配合款(仟元)	17268
計畫總經費(仟元)	50030		

計畫決標經費

監造經費(仟元)		工程經費(仟元)	
其他經費(仟元)			
三年成效評估(仟元)	☐ 是 ☒ 否		



貳、前瞻管理平臺-計畫基本資料

資本門計畫工程資訊填寫內容將作為後續前瞻計畫資訊公開區塊資料。

工程類型		流域	鴨母港溝																				
代表點經度		代表點緯度																					
工程簡介	• 工程基本資料 (1) 取水系統 含攔污柵、進流井、進流抽水 (2) 處理系統 含SBR曝氣池、曝氣機、污泥返送 (3) 加藥系統 含次氯酸鈉貯槽、次氯酸鈉加藥 (4) 放流系統 含補注水泵、上流式快濾桶 (5) 景觀工程 流水跌水設施、LED造景燈																						
目標成效說明	<table><thead><tr><th>環保署放流水標準 (法規值)</th><th>原污水 (設計值)</th><th>處理後放流水 (驗收標準)</th><th>備註</th><th>污染物去除-kg/day</th></tr></thead><tbody><tr><td>BOD5 (mg/L)</td><td>30</td><td>25</td><td>10 或去除率>60%</td><td>BOD5 (kg) 45</td></tr><tr><td>COD (mg/L)</td><td>100</td><td>60</td><td>25 或去除率>60%</td><td>COD (kg) 105</td></tr><tr><td>SS (mg/L)</td><td>30</td><td>25</td><td>5 或去除率>80%</td><td>SS (kg) 60</td></tr></tbody></table>			環保署放流水標準 (法規值)	原污水 (設計值)	處理後放流水 (驗收標準)	備註	污染物去除-kg/day	BOD5 (mg/L)	30	25	10 或去除率>60%	BOD5 (kg) 45	COD (mg/L)	100	60	25 或去除率>60%	COD (kg) 105	SS (mg/L)	30	25	5 或去除率>80%	SS (kg) 60
環保署放流水標準 (法規值)	原污水 (設計值)	處理後放流水 (驗收標準)	備註	污染物去除-kg/day																			
BOD5 (mg/L)	30	25	10 或去除率>60%	BOD5 (kg) 45																			
COD (mg/L)	100	60	25 或去除率>60%	COD (kg) 105																			
SS (mg/L)	30	25	5 或去除率>80%	SS (kg) 60																			
有無污水處理	☒ 是 ☐ 否																						

設計處理水量	3000 公噸/日	實際處理水量	公噸/日
預計施作面積	公頃	已營造親水空間	公頃
設計氨氮削減率	60 %	設計氨氮削減量	9 公斤/日
設計BOD削減率	60 %	設計BOD削減量	45 公斤/日
設計SS削減率	80 %	設計SS削減量	60 公斤/日



貳、前瞻管理平臺-計畫執行期程

- 依各計畫類型新增**預設填寫項目**，可自行新增/編輯/刪除。

前瞻計畫資料新增

計畫名稱 南崁溪上游水質淨化

基本資料

計畫執行

經費支出

考核文件上傳

工程計畫成果

計畫流程

編號	計畫流程	預計日期	實際日期	說明
1	上網公告		107-06-22	<button>編輯</button> <button>刪除</button>
2	開標		107-06-28	<button>編輯</button> <button>刪除</button>
3	評選		107-07-05	<button>編輯</button> <button>刪除</button>
4	決標		107-07-13	<button>編輯</button> <button>刪除</button>
5	計畫執行		107-07-19 ~ 108-03-31	<button>編輯</button> <button>刪除</button>
6	期中審查	107-01-24	107-01-27	<button>編輯</button> <button>刪除</button>
7	期末審查	107-05-02	107-05-02	<button>編輯</button> <button>刪除</button>

請選擇

- 備標
- 上網公告
- 開標
- 截標
- 流標
- 決標
- 簽約
- 決算
- 計畫執行
- 期初審查
- 期中審查
- 期末審查
- 工程會審算
- 驗收結算
- 施工
- 成效評估
- 已結案

編輯流程

計畫期程 決標

預定期程

說明

確定 取消

• 新增/編輯/刪除計畫流程



貳、前瞻管理平臺-計畫工作進度

- 依各計畫類型預設填報工作進度項目，可自行新增/編輯/刪除。
- 依各計畫工作預計/實際期程寄發信件通知填寫說明。

前瞻計畫資料新增

計畫名稱 南崁溪上游水質淨化

基本資料

計畫執行

經費支出

考核文件上傳

工程計畫成果

工作進度

編號	預計工作進度	預計日期	實際日期	說明	落後原因	改進措施
1	25	107-11-08	107-10-18			編輯 刪除
2	40	107-12-29	107-11-23			編輯 刪除
3	75	108-01-25	107-12-14			編輯 刪除
4	100	108-02-13	108-02-11			編輯 刪除

新增預計工作進度

新增預定估驗/工作進度

預計估驗/工作進度(%)

預定日期



實際

確定

取消

- 新增/編輯計畫各工作進度之預定日期與實際完成日期



貳、前瞻管理平臺- 計畫經費

- 計畫經費介接環境部BAF會計系統撥付及支用經費資料。
- 計畫期款將預設三項分別為一期、二期、尾款。

基本資料 計畫執行 經費支用 考核文件上傳 工程計畫成果

計畫經費撥付與執行總表

首次使用請用此功能查詢本計畫資料帶入環保署會計系統經費資訊 計畫帶入查詢

編號	年度	計畫名稱	總補助經費(仟元)	總撥付經費(仟元)	總支用經費(仟元)	支用比率(%)
1	107	南崁溪上游水質淨化	54,791.790	49,312.611	37,666.341	76.38

說明: 撥付經費及執行經費為環保署會計系統(BAF)資料加總

經費撥付細項

說明:
1. 撥付經費細項為介接環保署會計系統(BAF)資料。
2. 若下列細項不為本計畫經費撥付資料, 請聯絡維護單位更正計畫撥付經費。

編號	年度	計畫名稱	計畫代碼	簽證主號	撥付日期	撥付經費(仟元)	
1	107	桃園市-南崁溪水環境改善計畫-上游水質淨化工程	107G00053003000	107C003835	107-04-24	21,000.000	<button>刪除</button>
2	108	桃園市-南崁溪水環境改善計畫-上游水質淨化工程	107G00053003000	108C002501	108-05-15	28,312.611	<button>刪除</button>

經費支用細項

編號	年度	簽證序號	執行日期	支用金額(仟元)
1	107	107C003835001	107-09-28	7,553.679
2	107	107C003835001	107-10-04	3,901.431
3	107	107C003835001	107-10-29	4,168.790
4	107	107C003835001	107-12-24	3,187.889
5	108	108C002501001	108-03-14	2,188.211
6	108	108C002501001	108-06-26	15,004.856
7	108	108C002501001	108-12-23	1,661.485

計畫期款

編號	期款	金額(仟)	預定日期	實際日期	說明
1	一	2,500	108-07-31	108-07-31	<button>編輯</button> <button>刪除</button>
2	二	2,500	108-12-31	108-12-31	<button>編輯</button> <button>刪除</button>
3	尾	4,500	109-03-01		<button>編輯</button> <button>刪除</button>

- 計畫經費撥付與支用總覽
- 環境部BAF系統設定

- 環境部撥付本計畫經費明細

- 地方單位執行支用經費明細

- 計畫執行期款填寫



貳、前瞻管理平臺- 計畫經費帶入

- 依據環境部BAF會計系統資料帶入計畫相關經費資訊。

計畫經費撥付與執行總表

首次使用請用此功能查詢本計畫資料帶入環保署會計系統經費資訊

計畫帶入查詢

- 設定計畫帶入資料

編號	年度	計畫名稱	總補助經費(仟元)	總撥付經費(仟元)	總支用經費(仟元)	支用比率(%)
1	107	南崁溪上游水質淨化	54,791.790	49,312.611	37,666.341	76.38

環保署會計系統資料查詢

☐ 簽證主號 / ☒ 計畫名稱: 南崁溪

查詢

返回

- 依簽證主號(SNO)或計畫名稱查詢

計畫查詢結果

選取任一本計畫之會計系統(BAF)資料，系統帶入相關計畫代碼經費資訊

第 1 / 3 頁 | 共 28 筆 | 跳至 頁 | 上一頁 下一頁 每頁顯示 筆

項次	年度	計畫名稱	計畫代碼	簽證主號	撥付經費(仟元)	
1	108	桃園市-南崁溪水環境改善計畫-南崁溪經國二號橋上游至大檜溪橋下游護岸整建暨水域營造 (含休憩廊道串連)	107G00053107000	108C002556	39,214.963	加入
2	109	桃園市-南崁溪水環境改善計畫-上游水質淨化工程	107G00053003000	109C003601	0.000	加入
3	108	桃園市-南崁溪水環境改善計畫-南崁溪水汴頭水質淨化現地處理	107G00053003000	108C002556	39,214.963	加入
4	108	桃園市-南崁溪水環境改善計畫-上游水質淨化工程	107G00053003000	109C003601	0.000	加入
5	108	桃園市-桃園市南崁溪大檜溪橋水質淨化工程	105G00016129000	108C002373	615.762	加入

- 依計畫名稱、計畫代碼、簽證主號資料選取正確資料帶入



貳、前瞻管理平臺- 計畫經費支用

- 經費撥付與支用細項為地方執行單位填寫於環境部會計系統(BAF)資料，
- 因經費跨年度承轉等會計作業，若計畫撥付細項有疑義，請通知維護團隊調整。

經費撥付細項

說明:

1. 撥付經費細項為介接環保署會計系統(BAF)資料。
2. 若下列細項不為本計畫經費撥付資料，請聯絡維護單位更正計畫撥付經費。

編號	年度	計畫名稱	計畫代碼	簽證主號	撥付日期	撥付經費(仟元)	
1	107	桃園市-南崁溪水環境改善計畫-上游水質淨化工程	107G00053003000	107C003835	107-04-24	21,000.000	刪除
2	108	桃園市-南崁溪水環境改善計畫-上游水質淨化工程	107G00053003000	108C002501	108-05-15	28,312.611	刪除

- 若年度、撥付日期、經費有誤，可進行調整

經費支用細項

編號	年度	簽證序號	執行日期	支用金額(仟元)
1	107	107C003835001	107-09-28	7,553.679
2	107	107C003835001	107-10-04	3,901.431
3	107	107C003835001	107-10-29	4,168.790
4	107	107C003835001	107-12-24	3,187.889
5	108	108C002501001	108-03-14	2,188.211
6	108	108C002501001	108-06-26	15,004.856
7	108	108C002501001	108-12-23	1,661.485



貳、前瞻管理平臺- 計畫經費支用

- 計畫期款將預設三項分別為一期、二期、尾款。
- 依各期款預計/實際日期寄發信件通知填寫。

前瞻計畫資料新增

計畫名稱 南崁溪上游水質淨化

基本資料

計畫執行

經費支用

考核文件上傳

工程計畫成果

計畫期款

編號	期款	金額(仟)	預定日期	實際日期	說明
1	一	2,500	108-07-31	108-07-31	編輯刪除
2	二	2,500	108-12-31	108-12-31	編輯刪除
3	尾	4,500	109-03-01		編輯刪除

新增期款

返回

新增期款

期款	尾	預定日期	
金額(仟)	4500	預定請款工作進度	100
實際日期		實際金額(仟)	
說明			

- 編輯計畫預定向部內請款時程

確定

取消



貳、前瞻管理平臺-計畫文件上傳

- 依經資門計畫類型不同，需上傳項目不同
- 一次性上傳：依審查會日期(2周內)或計畫執行狀態(生態檢核或工程完工)上傳文件，
- 定期上傳文件：共通性項目包含預算執行進度管控表暨月報表、計畫執行情形表，每月10日前上傳，其他項目依計畫類型不同。

前瞻計畫資料新增

計畫名稱 南崁溪上游水質淨化

基本資料

計畫執行

經費支用

考核文件上傳

工程計畫成果

1. 一次性上傳基本資料(請於審查會議2周內上傳)

請選擇 選擇檔案 未選擇任何檔案

一次性上傳文件

項目	審查/公文日期	上傳日期	文件名稱	
計畫書				
修正計畫書及同意修正函文	109-03-26	109-03-24	臺南市鹽水區月津港水質改善及污水截流_計畫書.pdf	查看
設計成果簡報	109-03-20	109-03-24	臺南市鹽水區月津港水質改善及污水截流_計畫書.pdf	查看
公民參與相關會議紀錄	109-03-25	109-03-24	臺南市鹽水區月津港水質改善及污水截流_計畫書.pdf	查看
監造計畫書、施工計畫書、品質計畫書	109-03-31	109-03-24	臺南市鹽水區月津港水質改善及污水截流_計畫書.pdf	查看
試運轉計畫書				
核定案件規劃設計定稿				
資本門案件s-curve圖	109-03-01	109-03-27	臺南市鹽水區月津港水質改善及污水截流_計畫書.pdf	查看

2. 每月定期上傳資料(請於每月10日前上傳)

請選擇 選擇檔案 未選擇任何檔案 月份: 請選擇

定期上傳文件

項目	上傳日期	上傳文件	範例
預算執行進度管控表暨月報表	2月: 109-03-25 3月: 109-03-25 4月: 109-03-25	2月 3月 4月	附錄17-3 前瞻計畫進度管控表暨月報表(資本門工程案) EPA
計畫執行情形表	1月: 109-03-25	1月	附錄17-4 行政院環境保護署補助地方計畫執行情形表(前瞻計畫 經資門) EPA.xlsx
工程照片	1月: 109-03-26, 109-03-26, 109-03-26 2月: 109-03-26	1月 1月 1月 2月	
環境水質監測採樣結果	2月: 109-03-26	2月	附錄8-1 環境水質監測採樣結果.xlsx

3. 生態檢核自評表(細設、施工中、完工後1個月內上傳)

請選擇 選擇檔案 未選擇任何檔案

生態檢核自評表

項目	上傳日期	文件名稱	範例
生態檢核自評表	2月: 109-03-26 3月: 109-03-26	2月 3月	附錄16 公共工程生態檢核自評表.odt
成果報告	1月: 109-03-27 2月: 109-03-27	1月 2月	

4. 完工成果表(於主體工程完工後2週內上傳)

完工成果表 選擇檔案 未選擇任何檔案 完工日期:

完工成果表

項目	完工日期	上傳日期	文件名稱
完工成果表			



貳、前瞻管理平臺-計畫文件上傳

- 依經資門計畫類型不同，需上傳項目不同
- 一次性上傳：依審查會日期(2周內)或計畫執行狀態(生態檢核或工程完工)上傳文件，
- 定期上傳文件：共通性項目包含預算執行進度管控表暨月報表、計畫執行情形表，每月10日前上傳，其他項目依計畫類型不同。

前瞻計畫資料新增

計畫名稱 南崁溪上游水質淨化

基本資料

計畫執行

經費支用

考核文件上傳

工程計畫成果

工程計畫成果

工程計畫成果

計畫成果露出及擴大宣傳

請選擇



選擇檔案

未選擇任何檔案

上傳

刪除

願景圖 (若有配合設計成果產出)

查看

多媒體影音紀錄，包括圖卡、動畫、工程紀錄片或宣導短片

新聞摘要 (範例格式下載)

查看



貳、前瞻管理平臺-考評總覽

計畫資料上傳檢核報表			考評資料得分報表			計畫執行經費統計表																		
			資料更新日期:114-05-22前瞻基礎建設資料完整度(2%)																					
評分項目			臺北市	臺中市	基隆市	臺南市	高雄市	新北市	宜蘭縣	桃園市	嘉義市	新竹縣	苗栗縣	南投縣	彰化縣	新竹市	雲林縣	嘉義縣	屏東縣	花蓮縣	臺東縣	金門縣	澎湖縣	連江縣
計畫案件數(經常門/資本門共2案)			0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一次性上傳資料	修正計畫書、公民參與相關會議記錄、核定案件規劃設計定稿、S-curve圖		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
每月定期上傳	114年1月		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114年2月		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114年3月		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114年4月		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114年5月		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114年6月		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114年7月		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114年8月		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114年9月		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114年10月		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114年11月		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114年12月		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
生態檢核自評表或調查成果	生態檢核自評表		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	調查結果或報告		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
完工成果表			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工程計畫成果			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已完工之每月環境水質監測採樣結果(資本門工程)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
總分			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
考評得分換算(最高2分，超過2分以2分計)			0	1.4	0	0	0	0	0.4	1.6	0	0	0	0	0	0	1.2	0	0	0	0	0	0	0

- 配合114年度考核計畫新增「工程計畫成果」與之每月環境水質監測採樣結果(定期上傳文件)」
- 前年度完工114年上傳水質監測結果者可獲得該

- 配合114年度考核計畫新增「工程計畫成果」與「已完工之每月環境水質監測採樣結果(定期上傳文件)」
- 前年度完工114年上傳水質監測結果者可獲得該分數



參、前瞻管理平臺-填報提醒通知

- 郵件填報通知分為**每月定期通知**及**不定期通知**兩大類型
- 於**每月定期通知**信件，同縣市計畫綜整於相同一封郵件內容
- 於**不定期通知**信件，依各計畫填報項目及日期即時寄件通知

郵件填報通知	類型	對象	通知項目與時機	內容
	每月定期通知	計畫所屬縣市帳號	考核文件上傳： - 一次性上傳文件項目(審查2周內) - 每月上傳項目 發信時機： 每月6日凌晨12點檢核，未填報項目計畫將發信提醒	信件標題： [前瞻綜合管理平台] 114年5月 考核文件上傳提醒 表列提醒內容： 縣市、計畫名稱、待上傳內容(一次性上傳)、(每月上傳)
	不定期通知		計畫執行/經費支用： - 計畫流程 - 工作進度 - 計畫期款 發信時機： - 計畫項目填寫預計日期超過現在日期七日後	信件標題： [前瞻綜合管理平台] 計畫資料 填寫提醒 文字提醒內容： 您好，南崁溪上游水質計畫之 計畫流程填寫上網公告預定日期(112/07/20) 已超過七日，請盡速填寫相關資訊，謝謝。



114年前瞻計畫考核分數計算範例

114年無補助清淨河面，此項不計分

項次	縣市	計畫名稱	計畫類型	一次性上傳資料完整度	每月上傳資料(每月10日)					河岸面垃圾清除成果	生態檢核自評表	完工成果表	工程計畫成果	計分
					月份	預算執行進度管控表	計畫執行情形表	工程照片	環境水質監測結果					
1	新北市	新北市水質改善工程計畫-鴨母港溝補注水處理工程	資本門_工程	是	3月	否	否	否	否	無	是	否	否	一次性0.2+ 每月0.6+ 生態0.1 =0.9
					4月	否	否	否	否					
					5月	是	否	否	否					
					6月	是	否	是	否					
2		新北市水質改善工程計畫-瓦礫溝河道水質及景觀改善工程	資本門_工程	否	3月	否	否	否	否	無	否	否	否	一次性0+ 每月1.2 =1.2
					4月	否	否	否	否					
					5月	是	是	否	是					
					6月	是	是	否	是					
3		109年度新北市全國水環境清淨河面計畫	經常門_清淨河面	是	3月	是	是	無	是	是	否	否	一次性0.5+ 每月1.2++ 生態0.1 =1.8	
					4月	否	否		是					
					5月	是	是		是					
					6月	是	是		是					

- 假設新北市共三計畫，各計畫計分為一次性資料及每月上傳資料統計。
- 新北市三計畫各得分為0.9+1.2+1.8=3.9分，且無扣分項目，因前瞻基礎建設資料完整度最高分為2分，故**新北市得分為2分**。




肆、前瞻資訊整合及公開

配合管理計畫團隊整體計畫管控追蹤，於水質保護網前瞻專區公開成果



配合環境部資訊公開政策，視覺化資料呈現

各區管理計畫團隊(後臺填報)



前瞻計畫補助機關單位(後臺填報)



環境部



地方政府



<https://water.moenv.gov.tw/Public/CHT/Issue/WEConstruct.aspx>



肆、前瞻資訊整合及公開

配合各區計畫團隊整體計畫管控追蹤，於水質保護網前瞻專區公開成果

呈現所有水環境建設工程成果連結

編號	縣市	工程計畫名稱	年度	辦理進度	核定批次	工程類型	場址位置連結	場址詳細說明	生態檢核相關成果	地方政府案件資訊
1	宜蘭縣	宜蘭縣蘇澳鎮南方澳漁港地區水環境改善計畫	108	已完工	1	污水截流工程123	121.865483, 24.582237 連結	連結	pdf	連結
2	宜蘭縣	月眉排水第三期水道環境改善(工程)	108	已完工	1	景觀營造	121.801087, 24.669395 連結	連結	--	連結
3	宜蘭縣	宜蘭縣蘇澳鎮南方澳漁港地區週遭第二期水環境改善計畫	108	已完工	1	污水截流	121.868081, 24.581449 連結	連結	--	連結
4	南投縣	貓羅溪生態水環境改善計畫	108	已完工	1	生態濕地	120.695753, 23.915844 連結	連結	pdf	連結




整合單位提供之資料
若有連結變更，敬請通知



肆、前瞻資訊整合及公開-水庫集水區

全國水環境改善工程進度

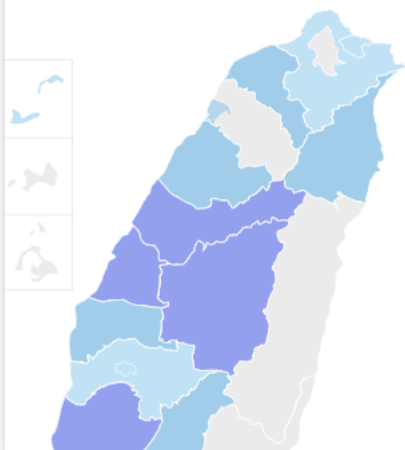

縣市推動工程現況

環境部協助各地方政府推動執行前瞻水環境建設計畫

前瞻水環境工程資訊表(ods)

↓ 清淨河面計畫

水庫集水區工程 >

全國 ▼ 推動進度統計 (共 81 項計畫)

● 建設計畫數

● 總處理水量(公

里進帳水空間



水質保護網
Water Quality Protection Web

水污染管制

水質改善

水管理

水污染防治費

水環境監督應變

議題專區

水質資訊

便民服務

環教專區

水庫集水區工程

首頁 > 議題專區 > 前瞻基礎建設 > 水庫集水區工程

水庫集水區工程簡介

環境部亦推動「水與發展-加強水庫集水區保育治理計畫」，透過加強水庫集水區內崩塌治理、野溪整治、水土災害預警應變、削減集水區生活與農業污染（含污染熱區營養鹽總量削減）、監測護水等工作，減少土砂產量，改善水水源水質，確保安全穩定供水，並由環境部主要推動執行「削減集水區生活與農業污染」及「監測護水」相關工作。

工程成果資料

編號	縣市	水庫集水區域	工程名稱	工程類型	辦理進度	場址位置連結	場址詳細說明
1	桃園市	石門水庫	石門水庫集水區上游水質改善評估規劃與設計	點源式污水處理、合併式淨化槽	已結案	24.827,121.301 連結	連結
2	雲林縣	湖山水庫	湖山水庫集水區及入庫溪流污染削減設施規劃及設計計畫	低衝擊開發設施LID/BMPs 1. 預鑄式污水處理設施淨化池 2. MSL(多層複合濾料淨化設施) 3. LID(非點源污染削減設施)	已結案	23.606,120.631 連結	連結



肆、前瞻資訊整合及公開- 社群網站

水質保護司及環境部官方臉書粉絲專頁分享前瞻工程成果

行政院環境保護署

美麗水岸

桃園市龍潭大池

利用現地處理技術「多層複合濾料水質淨化設施」(Mulit-Soil-Layering System)
每日處理水量可達18000公噸，設施上部景觀設計是特色環境教育公園



造景藝術



環境設施現況




若有工程資訊需公開，
歡迎聯繫提供素材

驚蟄

春天就要這麼嗨!!

桃園瑞興濕地



臺中綠川

環境部

2022年6月29日

【美籍水故事】龍潭大池...如果以為「水質淨化設施」就太單純了！廣善的淨化設施讓水質更乾淨，周邊環境也...

【推動永續水環境，東門溪水質淨化工程正式啟動！】

查看更多

推動永續水環境
東門溪水質淨化工程正式啟動！

重點治理 + 綠色永續 + 數位循環 三大水環境治理策略
整合流域管理，確保水環境更清澈、水資源更具韌性！

南崁溪

南崁溪

成效佳

美籍水故事 愛水就是美

3月5日

【驚蟄來啦！春天就要這麼嗨!!】

電影：驚蟄
隨著「驚蟄」節氣的到來，春天的氣息更加濃厚了！
這是春雷響起的時候，也是大地萬物復甦的最佳時機！
要求小編這個時候最想做的就是放下工作，去大自然中放鬆一下，來場春遊踏青！
這裡有兩個超棒的賞花踏青景點，保證讓你玩得開心，還能享受水澤之美！

●桃園瑞興濕地：
這裡的瑞興車道環繞21公頃的濕地，適合騎車的同時也親近自然的小徑。此外還有「濕地生態池」可以觀賞，聽說這裡可是鳥兒們的天堂，絕對不能錯過！
驚蟄就是，這裡有萬物復甦的臺灣大巨原生動物，趕緊來這裡賞花賞鳥，享受春天的美好吧！

●臺中綠川：
綠川結合了歷史文化和都市綠意，每天還能淨化3.6萬噸的污水，真的超厲害！
而且，還有個超好玩的「水手樂園」親子遊戲區，適合全家一起來玩。喜歡散步的家長可以帶著孩子，在綠川邊散步，欣賞兩岸的綠意，又喜歡親近水源，那麼這裡絕對適合你！

所以，不如趁著這個春意盎然的時節，和愛水小編一起「親近水環境」吧！
別忘了拍照打卡，在留言區分享你的小確幸囉~

#水質保護司 顯示較少

6,676 平方公尺
都會生態公園



感謝聆聽，敬請指教。
Thanks for your attention.

- 「前瞻基礎建設計畫綜合管理平臺」系統網址：<https://water.moenv.gov.tw/PMIS/login.aspx>
- 水質保護網資訊整合公開：<https://water.moenv.gov.tw/Public/CHT/Issue/WEConstruct.aspx>
- 前瞻管理平臺系統問題請洽 環興科技股份有限公司 (02)2778-8500
